NEXUS

Intranet corporativa para la gestión y comunicación interna


Integrantes:
- Benjamín Herrera
- Julián Tapia

Asignatura: Capstone - 003D
Docente: Cindy Betzabé Contador Cisterna

Nomed y su contexto

Nomed es una startup en etapa de crecimiento que, tras consolidarse en su mercado local, inició un proceso de expansión incorporando colaboradores remotos desde Chile, México, Perú y Rusia.

Esta nueva realidad convirtió al equipo en una operación distribuida geográficamente, donde la comunicación interna —antes directa y cara a cara— pasó a depender casi exclusivamente de WhatsApp, una herramienta pensada para mensajería personal, no para la gestión organizacional de una empresa en crecimiento.

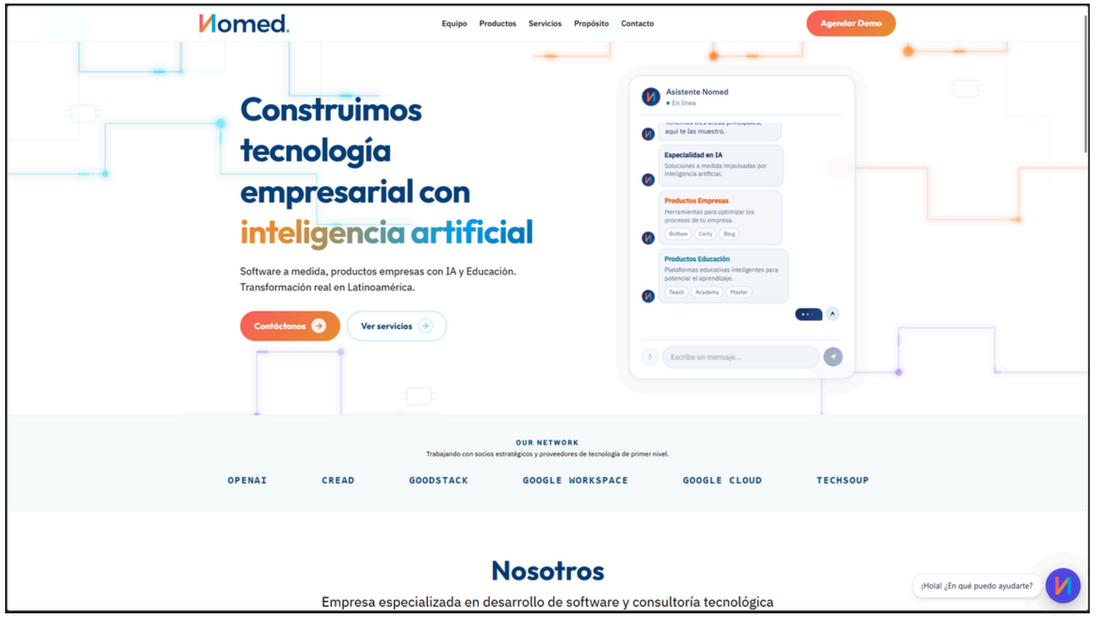

¿Qué problema se busca solucionar?

Nomed carece de una plataforma centralizada para la comunicación y organización interna. La gestión se realiza a través de múltiples grupos de WhatsApp, lo que provoca:


- Sobrecarga de información dispersa.
- Pérdida de mensajes y documentos importantes.
- Dificultad para coordinar tareas entre áreas.
- Pérdida de tiempo cambiando entre conversaciones.





Usuarios o personas afectadas

- Colaboradores de Nomed: quienes deben mantenerse al día con múltiples grupos y áreas.
- Líderes de equipo: responsables de coordinar tareas sin una visión unificada.
- Área de gestión/administración: encargada de centralizar procesos internos.
- Nuevos ingresos: sin un punto de entrada claro para integrarse al equipo.

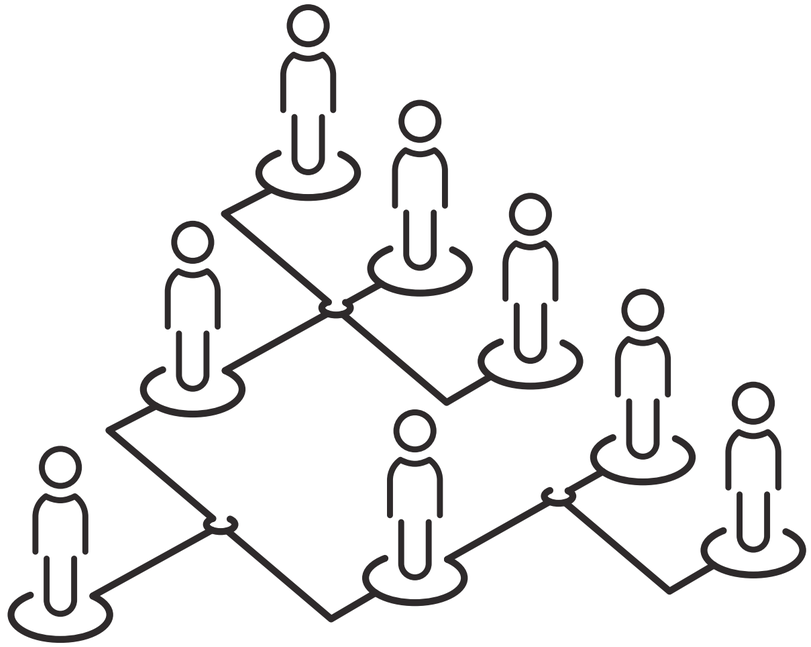

Descripción de la solución

Nexus es una intranet corporativa diseñada para centralizar la comunicación, la documentación y la coordinación de tareas en un único entorno accesible para todo el equipo de Nomed, sin importar su ubicación geográfica. Reemplaza la lógica fragmentada de múltiples grupos de WhatsApp por una plataforma estructurada por áreas, roles y necesidades reales de la operación.



OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una intranet corporativa —Nexus— que centralice la comunicación, la gestión documental y la coordinación de tareas del equipo distribuido de Nomed, mejorando la organización interna y reduciendo la dependencia de canales no diseñados para la gestión empresarial.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analizar los flujos de comunicación actuales en Nomed para identificar puntos críticos de fricción.
- Diseñar una arquitectura de información que organice la operación por áreas y roles.
- Implementar los módulos principales: comunicados, documentos, tareas, directorio y novedades.
- Validar la solución con usuarios reales mediante pruebas de uso y retroalimentación iterativa.
- Documentar el proceso de desarrollo para facilitar la mantención futura del sistema.



METODOLOGÍA SELECCIONADA: KANBAN



- Permite visualizar el flujo de trabajo completo en todo momento.
- Es flexible ante cambios de prioridad, frecuentes en proyectos en construcción.
- No impone sprints rígidos, ideal cuando el equipo avanza en paralelo a otras obligaciones.
- Facilita la detección de cuellos de botella y el balance de carga.
- Es liviano en ceremonias, lo que reduce la fricción administrativa.

El equipo trabajará sobre un tablero Kanban (Trello) con las siguientes columnas:

- Backlog: tareas identificadas pendientes de priorización.
- Por hacer: tareas priorizadas para el ciclo actual.
- En curso: trabajo activo.
- En revisión: funcionalidades listas para validación.
- Hecho: tareas finalizadas y verificadas.

Trello

CARTA GANTT (31 AGO – 04 DIC | ~14 SEMANAS)

Fase	Sem 1-2		Sem 3-4		Sem 5-6		Sem 7-8		Sem 9-10		Sem 11-12		Sem 13-14	
Análisis y requerimientos	■	■												
Diseño UX/UI			■	■										
Diseño técnico (arquitectura + BD)			■	■										
Setup del proyecto (repo, entorno, BD)					■	■								
Backend – Auth y usuarios					■	■	■	▒						
Backend – Comunicados y documentos							■	■	■	▒				
Backend – Tareas y directorio									■	■				
Frontend – Setup + autenticación					■	▒	■	▒						
Frontend – Comunicados y documentos							■	▒	■	■				
Frontend – Tareas, directorio y panel									■	■	■	▒		
Integración frontend-backend											■	■		
Pruebas funcionales y de usuario											■	■	■	
Documentación técnica y de usuario							■	▒	■	▒	■	▒	■	
Ajustes finales + presentación													■	■

Actividades, responsables y tiempos

Actividad	Responsable	Duración
Levantamiento de requerimientos	Benjamín Herrera	2 sem
Diseño UX/UI (wireframes + mockups Figma)	Julián Tapia	2 sem
Arquitectura de software y modelado BD	Benjamín Herrera	2 sem
Setup de repositorio, entorno y BD	Benjamín Herrera	1 sem
Backend: autenticación y gestión de usuarios	Benjamín Herrera	3 sem
Backend: módulo de comunicados y documentos	Benjamín Herrera	3 sem
Backend: módulo de tareas y directorio	Benjamín Herrera	2 sem
Frontend: estructura + login + perfiles	Julián Tapia	3 sem
Frontend: comunicados y documentos	Julián Tapia	3 sem
Frontend: tareas, directorio y panel	Julián Tapia	3 sem
Integración frontend-backend	Benjamín + Julián	2 sem
Pruebas funcionales y de usuario	Julián Tapia	2 sem
Documentación técnica y de usuario	Benjamín Herrera	4 sem
Ajustes finales y presentación	Todos	2 sem

STACK TECNOLÓGICO

Categoría	Herramienta
Gestión de proyecto	Trello (tablero Kanban)
IDE / Edición de código	Zed / Visual Studio Code
Framework backend	Laravel (entorno: Laravel Herd)
Framework frontend	Next.js
Gestor de paquetes JS	Node.js + npm
Base de datos	MySQL
Administración de BD	Beekeeper Studio
Control de versiones	Git + GitHub
Diseño / prototipado	Canva



Propuesta visual inicial

- Login / Autenticación – punto de entrada único para todos los colaboradores.
- Home / Dashboard – vista general con anuncios recientes, tareas pendientes y accesos directos.
- Comunicados – módulo de anuncios oficiales por área.
- Documentos – repositorio compartido con búsqueda y filtros.
- Tareas – tablero tipo Kanban interno para seguimiento por equipo.
- Directorio – listado del equipo con ubicación, rol y contacto.
- Panel de novedades – sección pensada para nuevos ingresos.



Flujo de navegación y respuesta a la problemática

Flujo básico:

1. El usuario inicia sesión.
2. Accede al dashboard, donde ve anuncios, tareas y novedades.
3. Navega a los módulos según necesidad (comunicados, documentos, tareas, directorio).
4. Los líderes publican anuncios o asignan tareas desde sus respectivos módulos.

Cómo responde a la problemática:

- Reemplaza la fragmentación de WhatsApp por un único entorno organizado por áreas.
- Reduce la sobrecarga cognitiva al mostrar la información ordenada y filtrable.
- Facilita la integración de nuevos colaboradores con un panel de onboarding claro.



Panel lateral

Informacion del perfil

Categorias

Secciones

Logout y ayuda

Dashboard

Usuario

Email

Rol

Publicaciones

Chat

Inicio

Panel lateral

Informacion del perfil

Categorias

Secciones

Logout y ayuda

Conversaciones

Boton nuevo chat

Panel de conversaciones

Menu de conversaciones

Conversaciones

Panel lateral

Informacion del perfil

Categorias

Secciones

Logout y ayuda

Ventana de documentos

Navegacion

Listado de cat. de documentos

Documentos

Documentos

Panel lateral

Informacion del perfil

Categorias

Secciones

Logout y ayuda

Nombre cat. Publicaciones

Informacion y explicacion

Formulario de nueva publicacion

Titulo

Boton de subida de archivos

Dropdown de departamentos

Contenido

Botones de gestion de publicacion

Preview feed

Publicaciones

Panel lateral

Informacion del perfil

Categorias

Secciones

Logout y ayuda

Informacion del perfil

Informacion y explicacion

Formulario de nuevo departamento

Nombre

Descripcion

Boton de crear departamento

Gestion de roles de departamentos

Listado de departamentos

Perfil

Panel lateral

Informacion del perfil

Categorias

Secciones

Logout y ayuda

Formulario para crear usuario

Nombre

Email

Contraseña

Dropdown departamento

Boton para crear usuario

Ventana de usuarios del sistema

Ventana de busqueda de usuario

Busqueda por categorias

Busqueda por navegacion

Listado de usuarios

Usuarios

¿QUÉ APRENDEREMOS EN ESTE DESAFÍO?

Técnicos:
- Aplicar Laravel y Next.js en un proyecto real de mediana escala.
- Modelar e implementar una base de datos en MySQL.
- Integrar frontend y backend a través de APIs REST.
- Usar Git y GitHub con flujo de ramas y code reviews.
- Diseñar una arquitectura modular y escalable.
- Traducir un prototipo de Canva a una interfaz funcional.

De gestión y equipo:
- Trabajar colaborativamente distribuyendo responsabilidades.
- Aplicar la metodología Kanban en Trello sobre un proyecto real.
- Priorizar funcionalidades bajo restricciones de tiempo.
- Tomar decisiones técnicas en equipo frente a problemas reales.
- Comunicar avances y resultados de forma efectiva.



CONCLUSIÓN

Nexus ataca un problema real de Nomed: la comunicación fragmentada en decenas de grupos de WhatsApp, que hoy frena la coordinación entre un equipo distribuido en varios países.

Impacto esperado: menos tiempo perdido buscando información, mejor coordinación entre áreas, integración más rápida de nuevos colaboradores y una base tecnológica para escalar.

Como equipo: construir una solución funcional, usable y mantenible que Nomed pueda adoptar, dando el salto de lo académico a lo profesional.

Siguiente paso: iniciar el desarrollo el 31 de agosto con análisis de requerimientos y diseño UX/UI, avanzando por iteraciones hasta el 04 de diciembre.

